




VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Valtion hankintojen digitalisointi – ohjelman tilannekatsaus

Handi-työpaja 2.10.2017, ohjelmapäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori




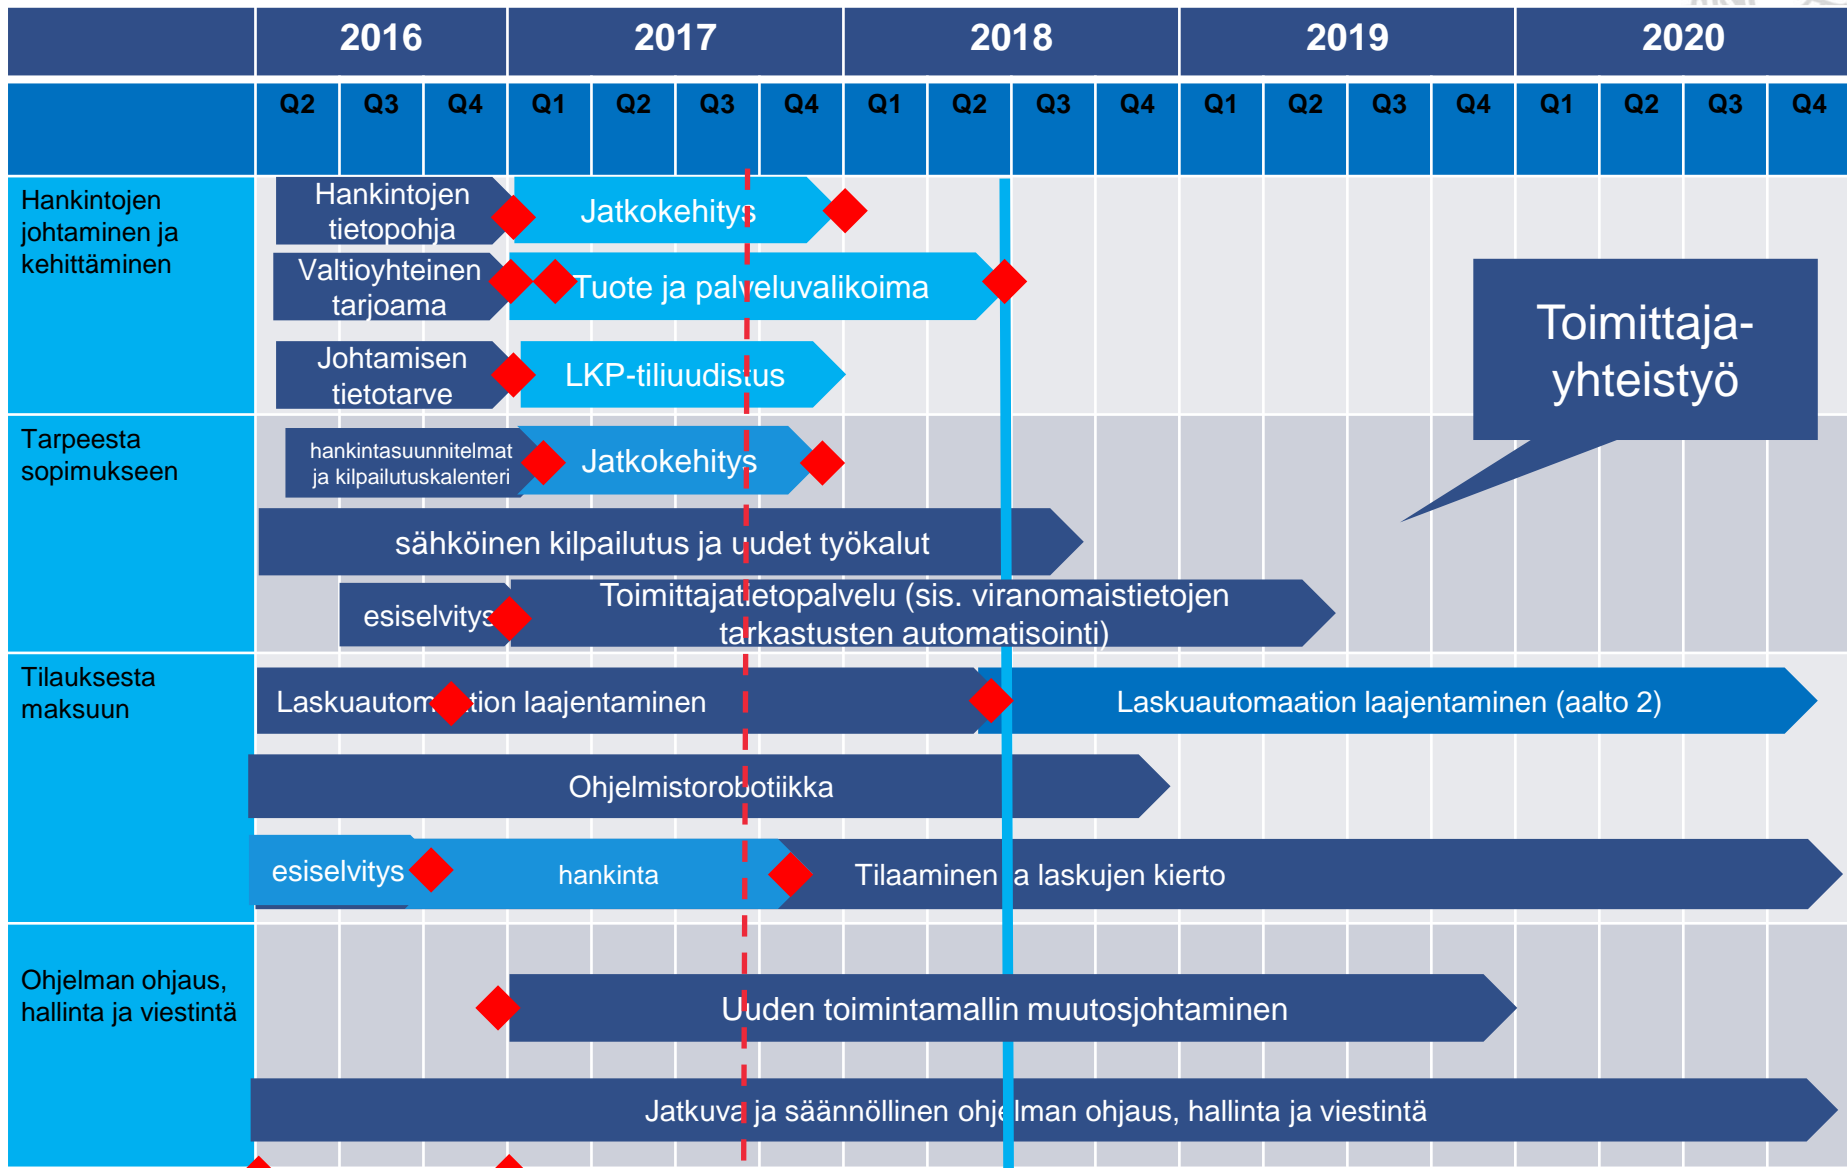

TOTA min.ryhmä

16.1. TOTA min.ryhmä

Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin 7.9. – 19.9.2017



Hankintojen tietopohjan hyödyntämisen jatkokehitys	Tutkihankintoja.fi –palvelu julkaistu kansalaisille maanantaina 4.9.2017. Data viety avoindata.fi:hin 6.9.2017. Media ”herännyt”, virastoja kontaktoitu ja lisätietoja kyselty. Erityisesti kiinnostaa anonymisoitu tieto. Kieliversioita aloitettu työstämään. Englanti ja ruotsi tarkoitus julkaista samanaikaisesti mahdollisimman pian. Muutamia muita toiminnallisuuksia tuodaan pian palveluun.
Tuote- ja palveluvalikoima – toteutus	Yhteishankintavelvoitteen piirissä olevat tuotteet: Hansel valmiina, Valtori: käyty läpi tietohallinnon hankinnat (mitkä puitejärjestelyt vain Valtorin kautta, mistä virasto voi tehdä oman sopimuksen puitejärjestelystä). Sisäiset toimittajat: Hanselin osalta toteutusvalmis. Haus ja Palkeet työstetään vielä. Valtori työstää katalogeja. Hankintayksiköiden sopimustietoja puuttuu 12 kirjanpitoyksiköltä. Saadut sopimustiedot luokiteltu. Sopimushierarkian ja tuotehierarkiatyön osalta tehty mitä tässä vaiheessa voidaan. Sopimusten ja toimittajatiedon vakiosisällön kuvauksen luonnos kommentoilla Palkeissa. LKP-tilien mäppäys tehty yli 70 000 tuotteelle. Tehtävä päivitys vielä LKP-tilikartan muutosten osalta.
LKP-tiliuudistus	Ehdotusta muutettavista on lähetty kommentoitavaksi kirjanpitoyksiköille ja rahastoille. Määräaika kommentoinnille päättyi 22.9. Uuden tilikartan viimeistely kommenttikierroksen tulosten pohjalta. Tilikartan järjestelmiin vienti 10-11/2017. Projektin päättäminen.

Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin 7.9. – 19.9.2017




Hankinta-suunnitelmien ja kilpailuskalenterin jatkokehitys	Vuoden 2018 suunnittelun ohjeistuksesta kirje virastoille kesäkuussa ja varsinainen ohjeistus annettu elokuussa. DL suunnitelmien palautukselle 12/2017. Hansel-sivuston tekninen toteutus on meneillään. Hankintasuunnitelmia työstetään loppuvuoden ajan. Kilpailuskalenteri on näkyvissä kaikille. Suunnitelmien tekoa tuetaan tarpeen mukaan.
Sähköisen kilpailutuksen käyttöönotto	<p>Projekti etenee käyttöönottojen osalta suunnitellussa aikataulussa. Kaiken kaikkiaan 91 organisaatiota on liittynyt puitejärjestelyyn. Tarjouspyyntöjä on julkaistu yli 1700 kpl, keskim. N. 200 kpl / kk.</p> <p>Minikisatoiminnallisuuden aikataulu tällä hetkellä 19.9. jonka jälkeen Hanselin puitejärjestelyt siirretään yksi kerrallaan asiakkaiden käytettäväksi.</p> <p>Hanselin DPS-pilotin valmistelu. Pilotointi Q4/2017. Mahdollisuus asiakaspilotointiin.</p>
Viranomaistietojen automaattiset tarkastukset kilpailutuksissa	<p>Toteutus etenee suunnitellusti. Pilotointi päättyy 1.10. Tavoitteena julkaista palvelu pilotoinnin jälkeen lokakuussa 2017 laajemmalle käyttäjäkunnalle.</p> <p>Tavoitteena on, että 11/2017 loppuun mennessä</p> <ul style="list-style-type: none">• palvelu käytössä kaikilla sähköisen kilpailuttamisen järjestelmää käyttävillä asiakkailla• teknisesti siirrytään käyttämään kansallista palveluväylää marraskuun aikana• projektin päättäminen

Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin 7.9. – 19.9.2017




Lasku-automaation laajentaminen	<p>Toteuma (kum.) tammi-heinäkuu 2017: Ostolaskuista 23,3% käsitelty automaatiotoiminnallisuuksia hyödyntäen. Täysin automaattisesti käsiteltyjen laskujen osuus oli 7,3%.</p> <p>Q3 mittaritietojen pohjalta laskutyypin uudelleen tarkastelu Q4/2017 Kirjanpitoyksikkökohtainen aktivointi 2017 loppuun mennessä.</p>
Rikosrekisterimerkintöjen sähköinen selvittäminen	<p>Uusi toimintokokonaisuus. Tavoitteena on saada rikosrekisteriote tai rekisterin tietojen tarkistaminen hankintayksiköiden saataville sähköisessä muodossa. Tämä vähentäisi merkittävästi kilpailutukseen liittyvää byrokratiaa ja työtä sekä hankintayksiköissä että tarjoajilla.</p> <p>Ensivaiheessa selvitetään nykytila ja esteet minkä vuoksi tietoja ei voida sähköisesti hankkia. Sen jälkeen määritetään toimenpiteet, joita tarvittaisiin tilanteen korjaamiseksi ja mikäli tilanteen korjaaminen on mahdollista valmistellaan tarvittavat toimet esim. mahdolliset muutokset lainsäädäntöön.</p> <ul style="list-style-type: none">- Lähtötilanne selvitys syyskuu 2017- Esitys jatkotyöksi lokakuu 2018
Maksuliikeratkaisun uudistaminen	<p>Käyttöönotto 1.10.2017. Lopputuloksena on se, että valtionhallinnossa on käytössä vain yksi yhteinen maksuliikennejärjestelmä (pl. PV). Nyt on 3 eri järjestelmää. Tehostumishyötyjä odotettavissa.</p> <p>Käyttöönottoerät on jouduttu muuttamaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen liittymäkohtaisiksi</p>


Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin 7.9. – 19.9.2017



<p>●</p>	<p>Tilaamisen ja laskujen käsittelyn uudistaminen</p>	<p>Basware ja Visma ilmoittivat heinäkuussa, etteivät tule jättämään tarjousta Määräaikaan 24.8. mennessä tarjouksen jätti SoftCo, jonka tarjous täyttää kelpoisuusvaatimukset. Käytettävyysarviointia tarjousten vertailtavuuden ja sovellusten pisteyttämiseksi ei tehty. Hankintapäätös tehtiin ja julkaistiin 1.9. Sopimuksen täydentäminen ja allekirjoitus, Palkeet – SoftCo johdon tapaaminen ja sopimuksen allekirjoitus 28.9.</p> <p>Toteutus ja tuotteistus käynnistyy Q4 alussa ja valmistuu pilotointiin n. Q1/2018 aikana. Organisaatioiden käyttöönoton projektisuunnittelun valmistuminen Q4/2017</p>
<p>●</p>	<p>Toimintamallin muutosjohtaminen / Ohjelmataso</p>	<p>Ohjaus: Kick off 22.9. tarkoitus luoda runko omalle toimintasuunnitelmalle. Case OP. Koulutus: Hankinta 2020 ensimmäinen luonnos, modulit hankintaprosessista, haasteita poisoppimisessa. Viestintä: Handi.fi. avattu. @HandiOhjelma kokoaa handilaiset-listan. Viestintäpaketti. Kilpailutuskoulutus & Hanki-klinikka 26.9. osallistujan silmin MuJo-tukiverkoston kick-off 22.9. Hallinnonalakierrokset Q4</p>

Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin 7.9. – 19.9.2017



	Toimittajayhteis-työn kehittäminen (Handi-järjestelmän lanseeraus toimittajille)	<p>Sovittu ensimmäisten infojen ajankohdat ja vastuut.</p> <p>Projektikortti on vyvissä https://vyvi-some3.vy-verkko.fi/vm/handi/Jaetut%20asiakirjat/Tyostettavat%20tuotokset/Toimitajayhteistyö/Valtion%20hankintojen%20digitalisointi%20-%20Projektikortti_toimittajayhteistyö.pptx</p> <p>13.10. Hanselin kategoriapäälliköiden info, 24.10. virastojen vastuuhenkilöille info (työpajan yhteydessä) Lokakuun Hanselin toimittajauutiskirjeessä ja Handin uutiskirjeessä toimittajille kutsu skype-infoon, kolme saman sisältöistä tunnin tilaisuutta</p>
---	---	--
